



prot. N. 29768 del 24/08/2015

OGGETTO: Lavori di: “**Infrastrutture area P.I.P. – Urbanizzazioni primarie – 2° Lotto - 1° Stralcio**” - CUP: **H46J14000000006**; b) CIG (SIMOG): **6220294CFB** -

**Stazione appaltante:** Comune di Capaccio, Via Vittorio Emanuele n. 1 – 84047 Capaccio (SA) - Tel. 0828/812260 – Fax. 0828/812239 - e-mail: [settorequarto@comune.capaccio.sa.it](mailto:settorequarto@comune.capaccio.sa.it) - Profilo di committente (URL): [www.comune.capaccio.sa.it](http://www.comune.capaccio.sa.it)

**ATI aggiudicataria:** Progettoimpresa s.r.l. Mandataria - Vertullo Costruzioni s.r.l. Mandante – Mandataria con sede in Altavilla Silentina (SA), Via Quecioni snc, P.I.: 05182630656;

**Importo complessivo lavori di progetto esecutivo:** € 4.651.767,97 di cui € 104.347,24 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

**Contratto:** in corso di stipula (sono decorsi i 35 giorni di cui all’Art. 11, comma 10, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.);

**Ribasso di gara:** 1,00%;

**Importo contrattuale netto:** € 4.606.293,76 compreso gli oneri della sicurezza;

**Oneri della Sicurezza:** € 104.347,24;

**RuP:** Dott. Ing. Carmine GRECO;

## PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI SOTTO RISERVA DI LEGGE

(ai sensi dell’art. 154 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. - D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.)

### PREMESSO

- Che con deliberazione di G.C. n. 37 del 29/01/2014 si approvò il Progetto esecutivo revisionato “**Infrastrutture area P.I.P. – Urbanizzazioni primarie – 2° Lotto - 1° Stralcio**”, località Sabatella – CAPACCIO (SA) - per l’importo lavori complessivo di € 6.650.000,00 di cui € 4.651.767,97 per lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza ed € 1.998.232,03 per somme a disposizione, revisione redatta internamente all’Amministrazione dall’Ing. Vincenzo Criscuolo Responsabile Area V del Comune di Capaccio;
- Che con determina n. 139 del 15/04/2014, Reg. Gen. n. 843 del 29/05/2014, si è riapprovato il quadro economico di spesa già allegato al progetto esecutivo revisionato dei lavori denominati < **Infrastrutture area P.I.P. – Urbanizzazioni primarie – 2° Lotto - 1° Stralcio** > per l’importo lavori complessivo di € 6.650.000,00 di cui € 4.651.767,97 per lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza ed € 1.998.232,03 per somme a disposizione dell’Amministrazione come si evince dall’ALLEGATO “Abis” alla determina stessa;
- Che i lavori di cui al presente contratto sono finanziati con Fondi Regione Campania - Deliberazione di Giunta Regionale n. 496 del 22/11/2013 recante ad oggetto “POR Campania FESR 2007-2013: iniziative di accelerazione della spesa DD.G.R. nn. 148 e 378 del 2013 – Adempimenti dove al progressivo 58 dell’ALLEGATO 1, che riporta l’elenco dei progetti potenzialmente coerenti

a valere sul POR FESR 2007/2013, ricade il **Comune di Capaccio** con l'intervento, ritenuto coerente, "**Infrastrutture area P.I.P. – Urbanizzazioni primarie – 2° Lotto - 1° Stralcio**" e Decreto Dirigenziale n. 221 del 31/03/2014;

- **CHE** il quadro economico di cui sopra non prevede alcuna spesa per espropri in quanto le aree oggetto d'intervento, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie, sono già di proprietà comunale;
- **Che** la Regione Campania con nota prot. 2015. 0136606 del 27/02/2015, fra l'altro, al Punto 8. espressamente richiedeva "*la relazione non chiarisce se i lotti siano già stati acquisiti dall'Ente con il perfezionamento delle procedure di esproprio, tanto al fine di accertare preliminarmente la funzionalità dell'intervento*";
- **Che** con Deliberazione di G.C. n. 113 del 24/03/2015, per rispondere al Punto 8. della nota regionale sopra richiamata, il comune di Capaccio approvava lo stralcio del piano particellare d'esproprio e lo schema dei Lotti serviti [Lotti 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14 e 21] dall'intervento di cui in oggetto ed il relativo piano particellare analitico d'esproprio di quantizzazione della spesa per il valore complessivo di € 1.320.000,00 che cade a carico del comune di Capaccio;
- **Che** con la medesima deliberazione si dava atto che la spesa totale degli espropri de quo, pari ad € 1.320.000,00, è anticipata dal comune di Capaccio per provvedere agli adempimenti atti a dimostrare la copertura finanziaria al fine di accertare preliminarmente la funzionalità dell'intervento come espressamente richiesto al Punto 8. della nota regionale prot. 2015. 0136606 del 27/02/2015 che sarà successivamente recuperata dal comune di Capaccio in seguito all'assegnazione, a mezzo di evidenza pubblica, dei Lotti 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14 e 21 serviti dalle opere relative al progetto esecutivo revisionato dei lavori di "**Infrastrutture area P.I.P. – Urbanizzazioni primarie – 2° Lotto - 1° Stralcio**" e del Lotto 3 già espropriato;
- **Che**, sempre in riferimento alla suddetta nota della Regione Campania prot. 2015. 0136606 del 27/02/2015, con nota comunale AREA VI Prot. n. 8332 del 05/03/2015, fu trasmesso alla Regione Campania, fra l'altro, il Cronoprogramma delle attività aggiornato che prevede fundamentalmente la durata dei lavori pari a 6 mesi e il tempo necessario al collaudo pari a 30 giorni e questo al fine di poter rispettare la tempistica imposta dagli Orientamenti di chiusura del PO Fesr 2007/2013 che dovrà finanziare l'opera;
- **Che** la LEGGE 27 febbraio 2015, n. 11 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre n. 192, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative – Anticipazione del 20% per gare entro il 31/12/2015, impone per le gare che si terrano entro il 31/12/2015, di prevedere l'anticipazione del 20% per cui si rese necessario adeguare il Capitolato Speciale di Appalto e lo schema del Contratto di Appalto anche per recepire le variazioni temporali sopra dette;
- **Che** con deliberazione di G.C. n. 133 del 10/04/2015 si riapprovò il Progetto esecutivo revisionato "**Infrastrutture area P.I.P. – Urbanizzazioni primarie – 2° Lotto - 1° Stralcio**", località Sabatella – CAPACCIO (SA) - per l'importo lavori complessivo di € 6.650.000,00 di cui € 4.651.767,97 per lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza ed € 1.998.232,03 per somme a disposizione, revisione redatta internamente all'Amministrazione dall'Ing. Vincenzo Criscuolo

- Responsabile Area V del Comune di Capaccio, per recepire tutte le modifiche riportate nella stessa fermo restando l'importo del finanziamento e l'importo dei lavori a base di gara;
- Che con determinazione a contrarre n. 70 dell'11/05/2015, Reg. Gen. n. 651 del 12/05/2015, si indiceva la procedura di affidamento del contratto di appalto dei lavori di **"Infrastrutture area P.I.P. – Urbanizzazioni primarie – 2° Lotto – 1° Stralcio"** mediante procedura aperta con preventiva pubblicazione del bando di gara, importo a base d'asta di € 4.651.767,97 di cui € 4.547.420,73 per lavori soggetto a ribasso ed € 104.347,24 per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso, oltre IVA al 10%, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa disciplinato dall'art. 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.;
  - Che a seguito di regolare procedura di gara con verbale finale n. 5 del 01/07/2015 la Commissione aggiudicatrice confermava la graduatoria definitiva provvisoria di cui al precedente verbale n. 4 del 24/06/2015 e decretava l'aggiudicazione provvisoria, salvo la verifica di cui all'Art. 48 del Codice dei Contratti, dell'appalto dei lavori di **"Infrastrutture area P.I.P. – Urbanizzazioni primarie – 2° Lotto – 1° Stralcio"**;
  - Che, esperite le verifiche d'ufficio di cui all'Art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., con determinazione n. 124 del 06/07/2015, Reg. Gen. n. 1008 del 07/07/2015, è stato aggiudicato definitivamente l'appalto dei lavori di **"Infrastrutture area P.I.P. – Urbanizzazioni primarie – 2° Lotto – 1° Stralcio"** all'ATI: **"Progettoimpresa s.r.l. Mandataria – Vertullo Costruzioni s.r.l. Mandante"**, Mandataria con sede in Altavilla Silentina (SA), Via Quecioni snc, P.I.: 05182630656, per il valore di € 4.606.293,76 comprensivo dell'importo di € 104.347,24 per gli oneri di sicurezza, oltre l'I.V.A. come per legge;
  - Che sono decorsi i 35 giorni di cui all'Art. 11, comma 10, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e, pertanto, con nota prot. n. 29569 del 21/08/2015 si chiedeva all'ATI aggiudicataria la documentazione necessaria per la sottoscrizione del contratto che, a norma dell'Art. 11, comma 9, del citato D.Lgs. n. 163 del 2006 e ss.mm.ii., deve avvenire entro il 07/09/2015;
  - Che al fine del cronoprogramma consolidato, che prevede la rendicontazione dell'intervento entro il 31/12/2015, si rende necessario procedere alla consegna lavori nel più breve termine possibile, anche se, ad oggi, non è stato ancora emesso il decreto dirigenziale regionale di assegnazione definitiva del finanziamento;
  - Che il contratto lavori è in corso di stipula (sono decorsi i 35 giorni di cui all'Art. 11, comma 10, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.);
  - Che con Verbale di gara del 21/08/2015 si è aggiudicato il **"Servizio tecnico di ingegneria – Ufficio di Direzione Lavori - Direzione Lavori, contabilità e misura dei lavori, assistenza al collaudo, prove di officina, liquidazione, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione"** relativamente alla realizzazione dei Lavori di: **"Infrastrutture area P.I.P. – Urbanizzazioni primarie – 2° Lotto - 1° Stralcio"**, procedura aperta ai sensi dell'art. 55, comma 1, D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. CUP: **H46J14000000006**; b) CIG (SIMOG): **6261357B3E** – al RTP: **"E.N.G. s.r.l. - Mandatario - Geol. Federico GIORDANO Mandante"**;

- Che con note del RuP, prot. n. 29613 e n. 29614 del 21/08/2015, si convocavano rispettivamente l'ATI ed il RTP sopra detto per oggi alle ore 9,00 sui luoghi dove effettuare i lavori per effettuare la consegna dei lavori sotto riserva di legge;
- Che in data 21/08/2015 si è sottoscritto il Verbale di cui all'Art. 106, comma 3., del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. per l'immediata cantierabilità con il quale il RUP e l'impresa si danno reciprocamente atto del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori;
- Che è stata trasmessa la Notifica Preliminare giusto prot. n. 29705 del 24/08/2015.

Il giorno **24** del mese di **AGOSTO** dell'anno **duemilaquindici**, in seguito al preavviso dato dal RuP si sono trovati sul luogo i sigg.:

- Dott. Ing. **Manfredo d'Onofrio**, Direttore Tecnico ed Amministratore della società di **Ingegneria E.N.G. s.r.l.**, in qualità di **Direttori dei Lavori**;
- **Geom. Diana MAURO**, in qualità di **Legale Rappresentante e socio unico** della **Mandataria società "Progettoimpresa s.r.l."** ed **Avv. Giuseppe VERTULLO** in qualità di **Amministratore Unico e Direttore Tecnico dell'Impresa "Vertullo Costruzioni s.r.l."** - Mandataria con sede in **Altavilla Silentina (SA), Via Quecioni snc, P.I.: 05182630656**;

per procedere, come hanno proceduto in contraddittorio, alla formale consegna dei lavori di cui trattasi.

Alla presenza continua degli intervenuti e con le spiegazioni dovute, la sottoscritta Direzione Lavori, giusta autorizzazione del Responsabile del Procedimento prot. n. 29614 del 21/08/2015, sulla scorta del progetto esecutivo approvato e dell'offerta presentata in sede di gara dall'ATI aggiudicataria ha designato i lavori da eseguire, ha riscontrato le misure e verificato i tracciamenti e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori medesimi. Altresì ha indicato le aree e ha preso atto dei mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori messi in cantiere dall'appaltatore che consistono genericamente in escavatori, pala meccanica e bobcat, autocarri, rulli vibranti, etc. di cui l'appaltatore medesimo s'impegna e rendere apposito elenco. L'appaltatore si riserva di approvvigionarsi dalle cave di prestito e di scaricare nelle discariche autorizzate o di reimpiegare, nell'ambito dello stesso cantiere, i materiali di risulta, previa caratterizzazione degli stessi, a seconda della disponibilità durante il periodo di esecuzione dei lavori. L'appaltatore dichiara che le aree sulle quali si devono eseguire i lavori di cui al progetto esecutivo approvato sono libere da persone e cose e che in ogni caso lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori medesimi.

Inoltre, la sottoscritta D.LL., ha dato lettura del Capitolato Speciale di Appalto, della nota di autorizzazione ai lavori, dello schema del contratto d'appalto, del bando e del disciplinare di gara lavori, degli atti di gara, e della offerta presentata dall'aggiudicatario in sede di gara, il tutto accettato dall'ATI aggiudicataria, aggiungendo, altresì, tutte le spiegazioni chieste e quelle trovate opportune per la perfetta comprensione ed esecuzione dei lavori anche alla luce delle migliori offerte dall'aggiudicatario in sede di gara e i tempi per la loro realizzazione. L'ATI, dovendo rispettare la tempistica regionale per la rendicontazione che deve avvenire entro il 31/12/2015 ed in ossequio alle dichiarazioni presentate in sede di gara, propone il crono programma lavori aggiornato rispetto alla data di consegna e congruente con la tempistica disponibile. La D.LL., visti gli atti di gara per l'affidamento dei lavori, esaminato il crono programma proposto dall'ATI ritiene lo stesso congruo in considerazione dell'offerta formulata dall'ATI in sede di gara e, previa presa visione e sottoscrizione per accettazione dello stesso da parte dell'organo

di collaudo all'uopo convocato dal RuP con nota prot. n. 29612 del 21/08/2015, sottoscrive per accettazione il crono programma che, fin da subito, diventa impegnativo per le parti e fa parte integrante del contratto di appalto in corso di sottoscrizione.

Infine la D.LL. riferisce che l'ATI aggiudicataria è tenuta a rispettare le disposizioni contenute nell'Art. 131 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.. In particolare al piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., da aggiornare in base al crono programma di cui sopra si è detto, e le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 17/2010 (Direttiva macchine); il datore di lavoro appaltatore, gli eventuali subappaltatori e gli eventuali lavoratori autonomi saranno tenuti a redigere e ad attuare il piano di sicurezza operativo (POS) ed eventuali proposte integrative al PSC, così come prescritto dall'Art. 131 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., nonché ad elencare le attrezzature che verranno utilizzate sul cantiere in oggetto, con i relativi documenti di conformità alle norme vigenti. In ogni caso, l'ATI appaltatrice dovrà redigere ed attuare il piano operativo di sicurezza del cantiere (POS), per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare e di dettaglio del succitato piano di sicurezza e di coordinamento, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche.

Il Geom. Diana MAURO, in qualità di Legale Rappresentante e socio unico della Mandataria società "Progettoimpresa s.r.l." e l'Avv. Giuseppe VERTULLO in qualità di Amministratore Unico e Direttore Tecnico dell'Impresa "Vertullo Costruzioni s.r.l.", Appaltatori dei lavori in parola, forniti già di copia del progetto esecutivo, del Capitolato Speciale, del bando e del disciplinare di gara reggente l'appalto, nella qualità summenzionata dichiarano di essere pienamente edotti di tutte le circostanze di fatto e di luogo inerenti all'esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi accollati all'ATI dal precisato Capitolato Speciale d'Appalto, dal Bando, dal Disciplinare di gara e dall'offerta dalla stessa ATI presentato in sede di gara, e di accettare col presente atto la formale consegna dei lavori suindicati senza sollevare riserva od eccezione alcuna, restando inteso che dalla data del presente verbale decorre il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori, stabilito come da allegato Cronoprogramma, in giorni 108 (centootto) naturali e consecutivi, cosicché l'ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire entro il 10/12/2015.

Resta espressamente stabilito che l'ATI dovrà far pervenire alla Direzione Lavori e al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione la seguente documentazione:


1. Denuncia agli Enti Assistenziali e Previdenziali;
2. Piano Operativo di Sicurezza (POS), ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;
3. Elenco dettagliato delle attrezzature e macchinari da utilizzare in cantiere, ai sensi del D.Lgs. n. 17/2010;
4. Nominativo del Direttore Tecnico dell'ATI, dei Responsabili tecnici delle due Imprese nonché del Responsabile della Sicurezza ed eventuali preposti delle medesime.

Si dà atto che la presente consegna dei lavori è avvenuta sotto riserva di legge nelle more della stipula contrattuale con la quale si sciolgono le riserve suddette.

La D.LL. dispone, nelle more della sottoscrizione del contratto, che l'ATI provveda all'allestimento del cantiere e prediponga gli atti per il relativo deposito al Genio Civile per il rilascio dell'Autorizzazione sismica.

Del che è verbale che, letto e condiviso, è controfirmato per accettazione dalle parti in duplice copia di cui una verrà trasmessa per gli opportuni provvedimenti al Responsabile Unico del Procedimento.

L'ATI appaltatrice:




Geom. Diana MAURO, in qualità di Legale ~~PROGETTOIMPRESA s.r.l.~~ socio unico della Mandataria società "Progettoimpresa s.r.l." \_\_\_\_\_  
C.F. 011185182630656  
Via...  
84045 Arzavilla Silentina (SA)

Avv. Giuseppe VERTULLO in qualità di Amministratore Unico e Direttore Tecnico dell'Impresa "Vertullo Costruzioni s.r.l." \_\_\_\_\_

La Direzione Lavori: Dott. Ing. Manfredo d'Onofrio, Direttore Tecnico ed Amministrato della società di Ingegneria E.N.G. s.r.l., in qualità di Direttori dei Lavori,

Visto: Il responsabile unico del procedimento Dott. Ing. Carmine GRECO Resp. LL.PP. Area VI \_\_\_\_\_

  
26/08/2015

  
Vertullo costruzioni s.r.l.  
Ufficio Provinciale Cervati, 43 - Poggiore (SA)  
Dott. Ing. G. Vertullo  
C.F. 011185182630656  
I.V.A. 0471082065





# COMUNE DI CAPACCIO

Provincia di SALERNO

## Piano per gli Inseidiamenti Produttivi Progetto: "Infrastrutture area P.I.P. - Urbanizzazioni primarie - 2° Lotto - 1° Stralcio"



<b>COMMITTENTE</b>		<b>Fase progettuale:</b>	
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAPACCIO (SA)		PROGETTO ESECUTIVO 2° LOTTO 1° STRALCIO ADEGUATO ALL'OFFERTA MIGLIORATIVA	
EMISSIONE 0 del: GIUGNO/2008 REVISIONE 1 del: GENNAIO/2014 REVISIONE 2 del: APRILE/2015 REVISIONE 3 del: AGOSTO/2015 Riformulazione del progetto Esecutivo variato ai sensi dell'Art.1.8.4 numero 23) del Capitolato Speciale di Appalto		COORDINAMENTO GENERALE: Ing. Carmine GRECO - Area VI COORDINAMENTO STRUTTURE: Ing. Carmine GRECO - Area VI COORDINAMENTO IMPIANTI: Ing. Carmine GRECO - Area VI COORDINAMENTO SICUREZZA: Ing. Carmine GRECO - Area VI	
ELABORATO TECNICO <b>CRONOPROGRAMMA LAVORI</b>		<b>ATTI ESECUTRICE</b> PROGETTO IMPRESA S.r.l. PROGETTO IMPRESA S.R.L. VERTULLO COSTRUZIONI S.R.L. Strada Provinciale 43 - Piacenza (SA) C.F. e P. IVA 04710820655	
IL PROGETTISTA DELL'ATI ESECUTRICE Ing. Lucio PECORARO		R.U.P.: Ing. Carmine GRECO - Area VI	
		IL SINDACO: (Dott. Italo VOZA)	



DATA AGOSTO 2015  
TAVOLA  
**N. 57**

GOVERNMENT OF CANADA

1982-83

Department of Finance

Financial Statement

for the year ended March 31, 1983

Volume 1



1982-83

1983



**PROGITTOIMPRESA s.r.l.**  
 C.F. 01472310656  
 C. de' Coltelloni snc  
 84045 Alivudda Silentina (SA)


**B** Vertullo  
 costruzioni s.r.l.  
 Strada Provinciale Caselli, 43 - Piaggine (SA)  
 C.F. 0147110820657

*C. Orsini d'Accursi IL D.L.*

Stampa circolare: DOTT. ING. MANFREDO d'ONOFRIO  
 ISCRITTO ALL'ALBO PROFESSIONALE COL. N. 1329  
 ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Stampa circolare: DOTT. ING. MANFREDO d'ONOFRIO  
 ISCRITTO ALL'ALBO PROFESSIONALE COL. N. 1336  
 ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Cod.	Attività	Inizio	Fine	Durata gg.
1	Attesimento del cantiere con sistemazione piste di cantiere per viabilità alternativa da migliorare	24/08/2015	27/08/2015	3
2	Bonifica e Smaltimento rifiuti pericolosi ed amianto invernati in cantiere da migliorare	27/08/2015	29/08/2015	2
3	Rimozione rilevato - Movimentazione Terra	29/08/2015	05/09/2015	7
4	Fondazione su pali da migliorare - Rilevato Stradale	05/09/2015	17/09/2015	12
5	Posa in opera impianto Fognaio	12/09/2015	30/09/2015	18
6	Formazione rilevato, sottofondo e massiccata stradale	12/09/2015	30/09/2015	18
7	Scavi a sezione obbligata	12/09/2015	18/09/2015	6
8	Posa in opera di tubazione impianti P.I. e Enel	18/09/2015	30/09/2015	12
9	Posa in opera di condotta idrica	17/09/2015	30/09/2015	13
10	Ritirato di scavo a sezione obbligata	30/09/2015	10/10/2015	10
11	Opere d'arte - inizio Lavori del ponte su Rio La Ligrana	30/09/2015	07/10/2015	7
12	Ristrutturazione Vasca di Sollevamento e revisione elettromeccanica da migliorare	10/10/2015	19/10/2015	9
13	Realizzazione Canale "D" e "L" su Pali con ringhiera perimetrali e Sistemazione Canale "A" da migliorare	07/10/2015	16/10/2015	9
14	Realizzazione Porzione Asse Stradale 3 da migliorare	07/10/2015	16/10/2015	9
15	Realizzazione impianto di illuminazione, irrigazione e Sistemazione Marciapiede con piantumazione alberi da migliorare	19/10/2015	29/10/2015	10
16	Realizzazione Delle vasche di trattamento delle acque di prima pioggia da migliorare	16/10/2015	26/10/2015	10
17	Realizzazione muri di recazione lotti da migliorare	29/10/2015	07/11/2015	9
18	Opere d'arte - Fine Lavori del ponte su Rio La Ligrana	26/10/2015	07/11/2015	12
19	Realizzazione muri	07/11/2015	19/11/2015	12
20	Realizzazione cordoli e zanella	07/11/2015	19/11/2015	12
21	Pavimentazione marciapiedi	19/11/2015	04/12/2015	15
22	Formazione Marlo Stradale	19/11/2015	04/12/2015	15
23	Verifica strutture e impianti e Smobilito cantiere	04/12/2015	10/12/2015	6

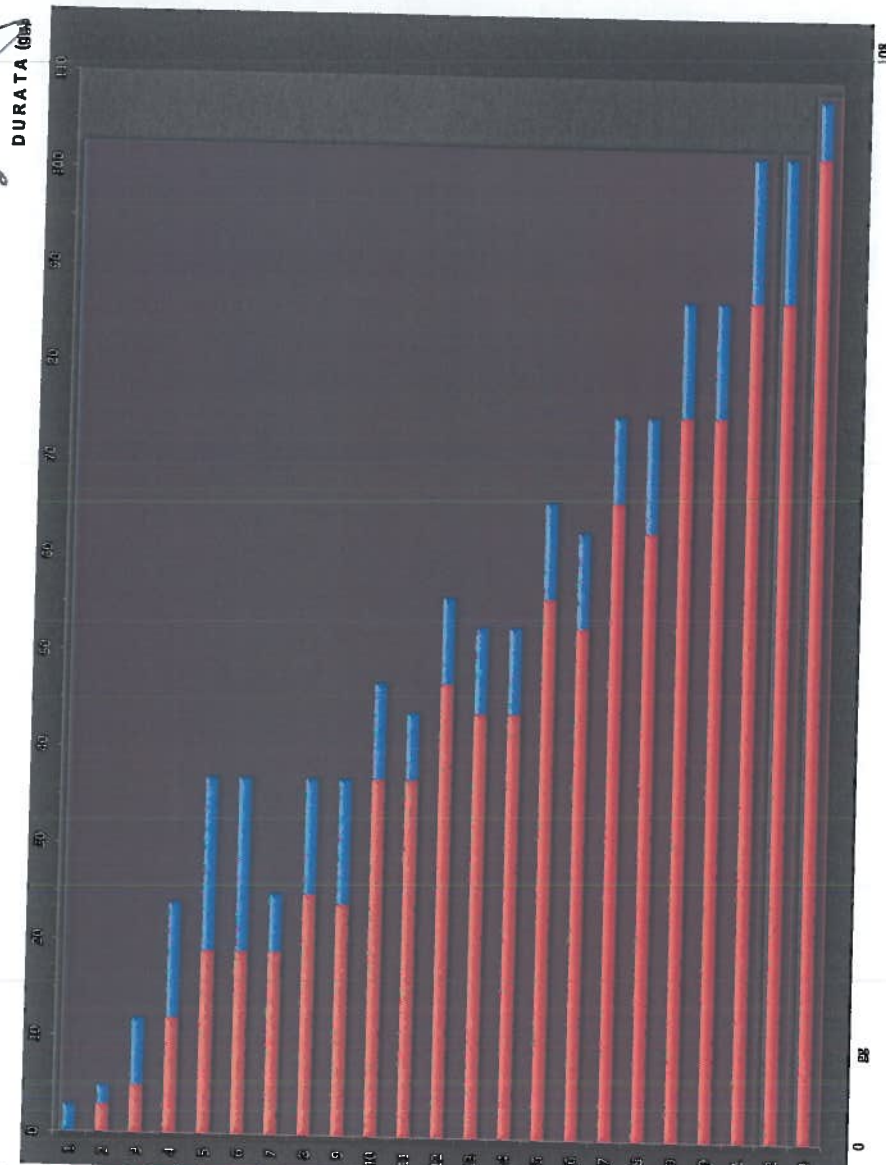

108 gg. naturali consecutivi

1938  
MILANO  
DEGLI INGEGNERI E  
ARCHITETTI  
DOTT. ING.  
MILANO  
DEGLI INGEGNERI E  
ARCHITETTI  
DOTT. ING.  
MILANO

1938  
MILANO  
DEGLI INGEGNERI E  
ARCHITETTI  
DOTT. ING.  
MILANO

1938  
MILANO  
DEGLI INGEGNERI E  
ARCHITETTI  
DOTT. ING.  
MILANO
