



# COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

(Provincia di Salerno)

PROGETTO:

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA CONDOTTA  
SOTTOMARINA DI SCARICO NEL COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

## PROGETTO ESECUTIVO

TAV. N°

L

ELABORATO:

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

SCALA

DATA

FEBBRAIO 2018

AGGIOR.

IL PROGETTISTA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



AREA IV  
Il Responsabile del Servizio I  
Dottore in Ingegneria  
Christian FRANCO

**COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM**

**PROVINCIA DI SALERNO**

# **RELAZIONE CRONOPROGRAMMA**

**OGGETTO:** LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA  
CONDOTTA SOTTOMARINA DI SCARICO NEL COMUNE DI  
CAPACCIO PAESTUM

**COMMITTENTE:** AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAPACCIO PAESTUM

Capaccio Paestum, 01/02/2018



Il Tecnico

**AREA IV**  
**Il Responsabile del Servizio 1**

Dottore in Ingegneria

**Christian FRANCO**

# COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

## PROVINCIA DI SALERNO

**OGGETTO:** LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA  
CONDOTTA SOTTOMARINA DI SCARICO NEL COMUNE DI  
CAPACCIO PAESTUM

**COMMITTENTE:** AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAPACCIO PAESTUM

### RELAZIONE

### CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Il CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lettera h) dell'articolo 33 del D.P.R. 207/2010 quale documento del progetto esecutivo da allegare al contratto ai sensi del comma 1 lettera f) dell'articolo 137 dello stesso D.P.R. 207/2010, è stato redatto ai sensi dell'art.40 del ripetuto D.P.R. 207/2010.

#### Tempi di esecuzione

Uno degli obiettivi del cronoprogramma è quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai calcoli effettuati è risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari **365** giorni naturali e consecutivi.

#### Andamento stagionale sfavorevole

Nel calcolo della durata delle attività, definita con riferimento ad una produttività di progetto ritenuta necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante, si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonché della chiusura dei cantieri per festività.

Posta pari al 100% la produttività ottimale mensile è stato previsto che le variazioni dei singoli mesi possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttività a seconda di tre possibili condizioni: Favorevoli, Normali e Sfavorevoli.

I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella

#### Tabella Climatico Ambientale:

condizione	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	media
Favorevole	90	90	90	90	90	90	90	45	90	90	90	45	82.5
Normale	15	15	75	90	90	90	90	45	90	90	75	15	65
Sfavorevole	15	15	45	90	90	90	90	45	90	75	45	15	58.75

Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sarà l'effettiva data d'inizio dei lavori, si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come

percentuale media di riduzione sulle attività lavorative durante tutto l'arco dell'anno con aumento temporale analogo di ogni attività, indipendentemente dalla successione temporale.

In fase di redazione del programma esecutivo, quando si è a conoscenza della data d'inizio dei lavori, l'impresa dovrà collocare le attività durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione, che nell'arco dell'anno avrà diversi tipi di incidenza sulla produttività che potranno essere di diminuzione o di aumento rispetto alla media considerata in fase di progetto.

### **Produzione mensile**

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si evince che l'impresa deve garantire, attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una produzione mensile media tale da poter realizzare una quantità di lavorazioni corrispondente ad un importo di euro 171'366,02 ed ad una produzione massima mensile corrispondente ad un importo di euro 250'925,13 .

L'impresa che dovrà eseguire i lavori deve considerare i dati innanzi espressi come condizione minima da dover soddisfare, nonostante che il programma esecutivo, che la stessa dovrà stilare prima dell'inizio dei lavori, possa portare a dati differenti da quelli desunti dall'allegato cronoprogramma.

### **Prezzo Chiuso**

L'allegato cronoprogramma dei lavori è redatto al fine di stabilire in via convenzionale, nel caso di lavori compensati a prezzo chiuso, l'importo degli stessi da eseguire per ogni anno intero decorrente dalla data della consegna.

Di seguito si riportano gli importi dei lavori da eseguire per anni interi a decorrere dalla consegna dei lavori:

- anno 1 - **Importo** euro 2'056'392,22;
- anno 2 - **Importo** euro 0,00;

Il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso d'inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture da emanare entro il 31 marzo di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.

Capaccio Paestum, 01/02/2018

Il Tecnico  
**AREA IV**  
**Il Responsabile del Servizio 1**  
Dottore in Ingegneria  
**Christian FRANCO**



# COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

PROVINCIA DI SALERNO

## Cronoprogramma di PROGETTO

**OGGETTO:** LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA CONDOTTA SOTTOMARINA DI SCARICO NEL COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

**COMMITTENTE:** AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAPACCIO PAESTUM

Capaccio Paestum, 01/02/2018




Il Tecnico


AREA IV


Il Responsabile del Servizio I

Dottore in Ingegneria

Christian FRANCO

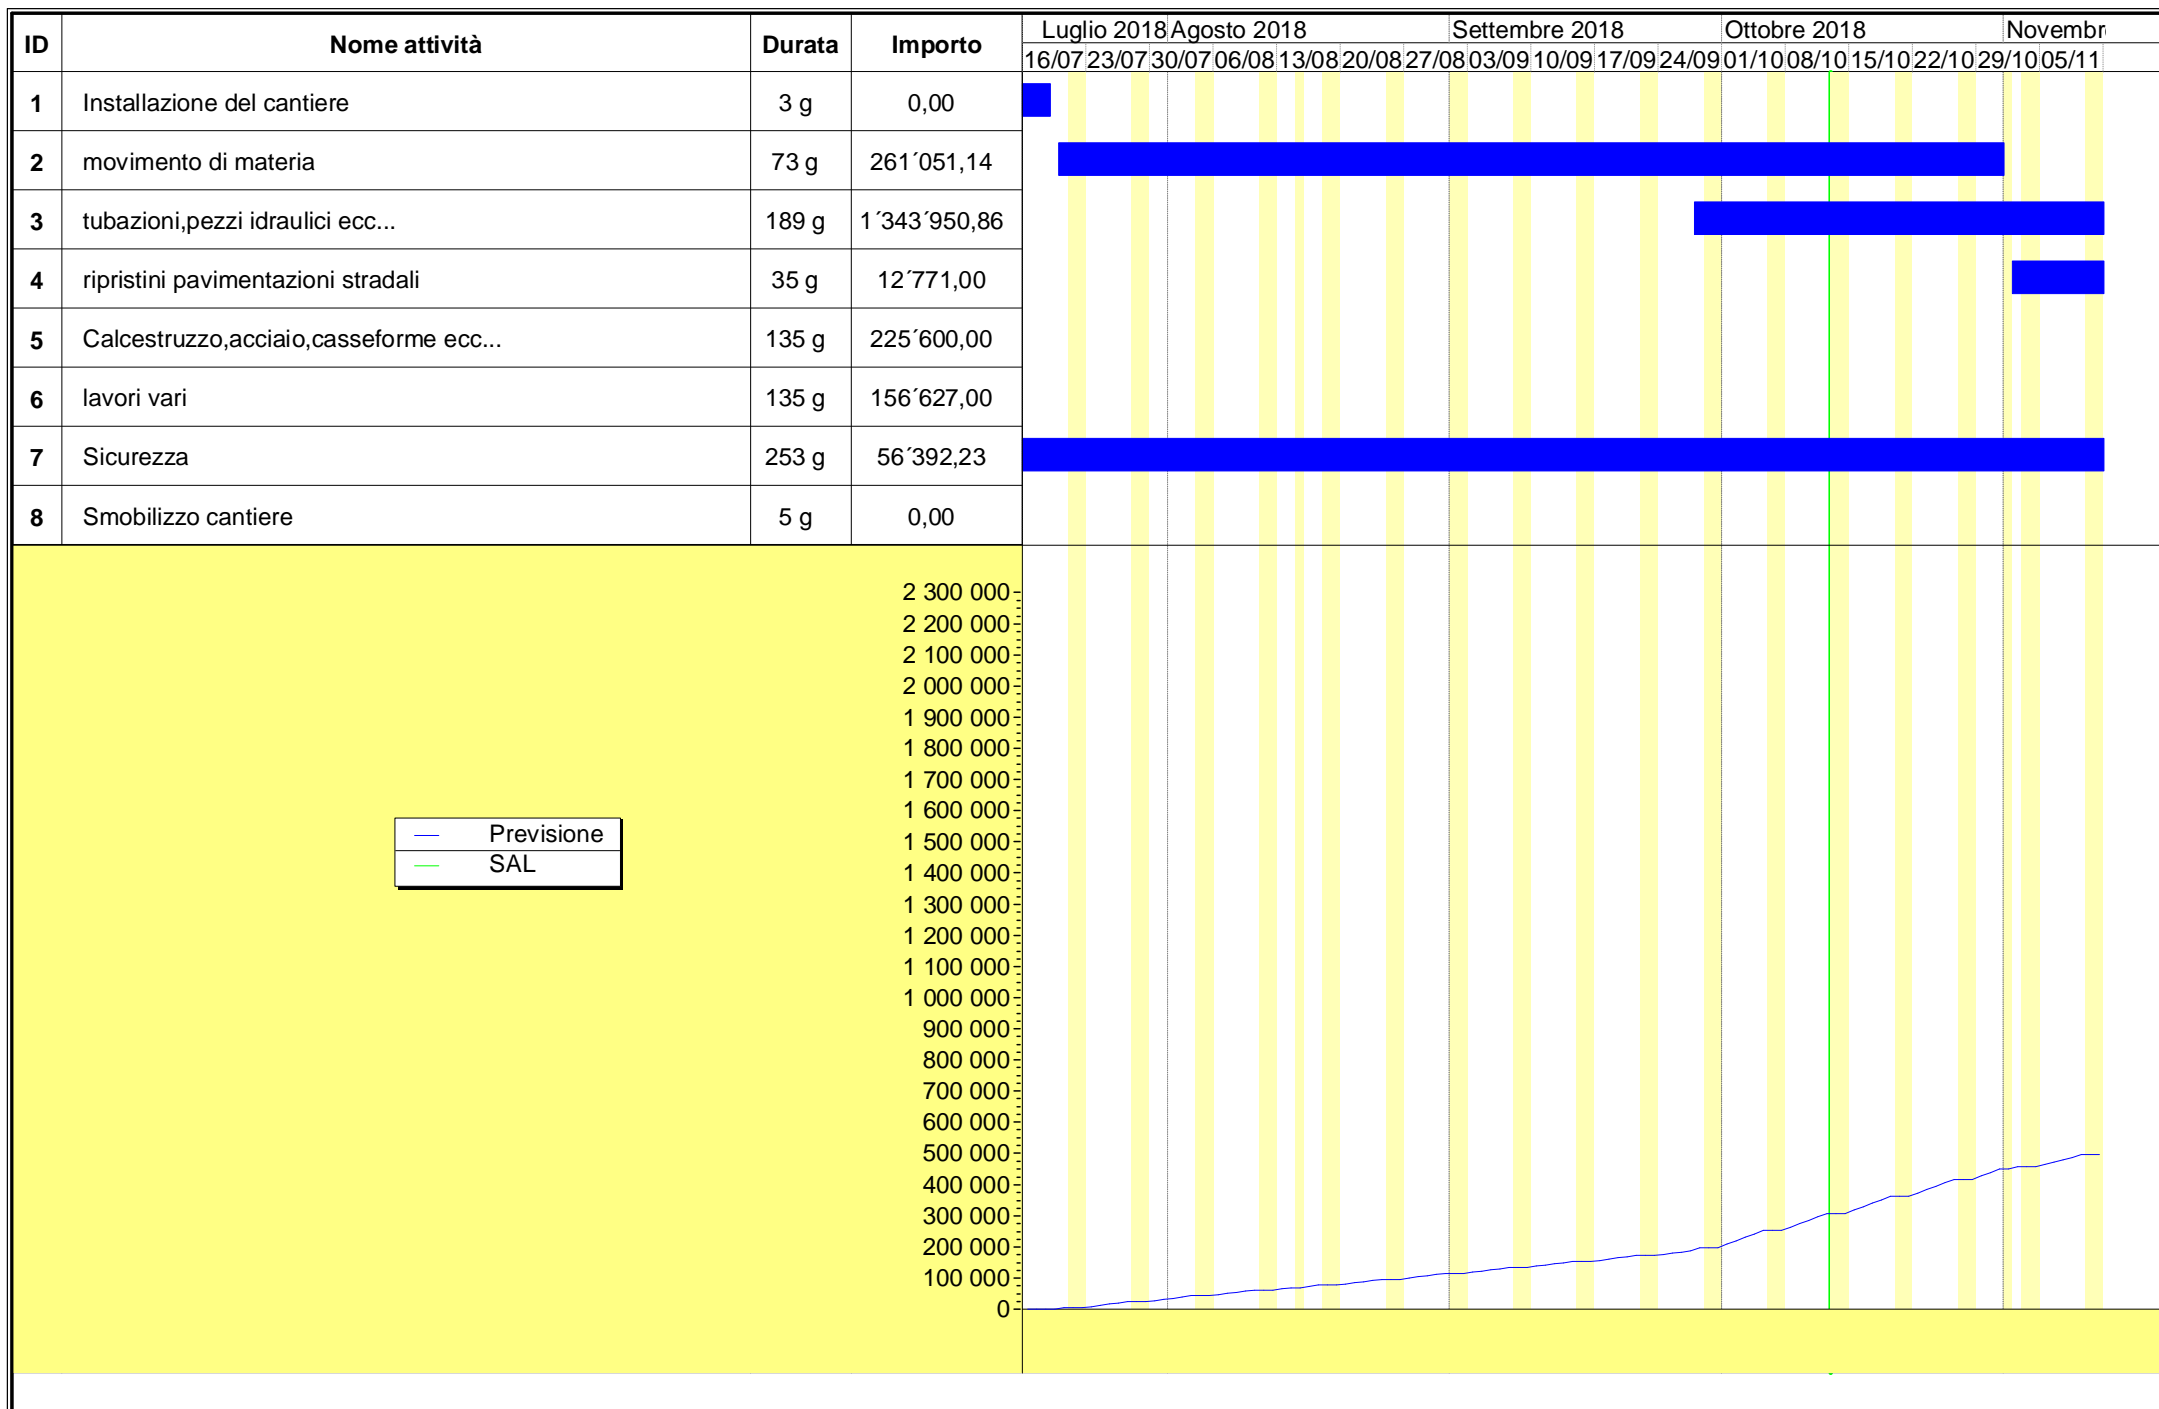

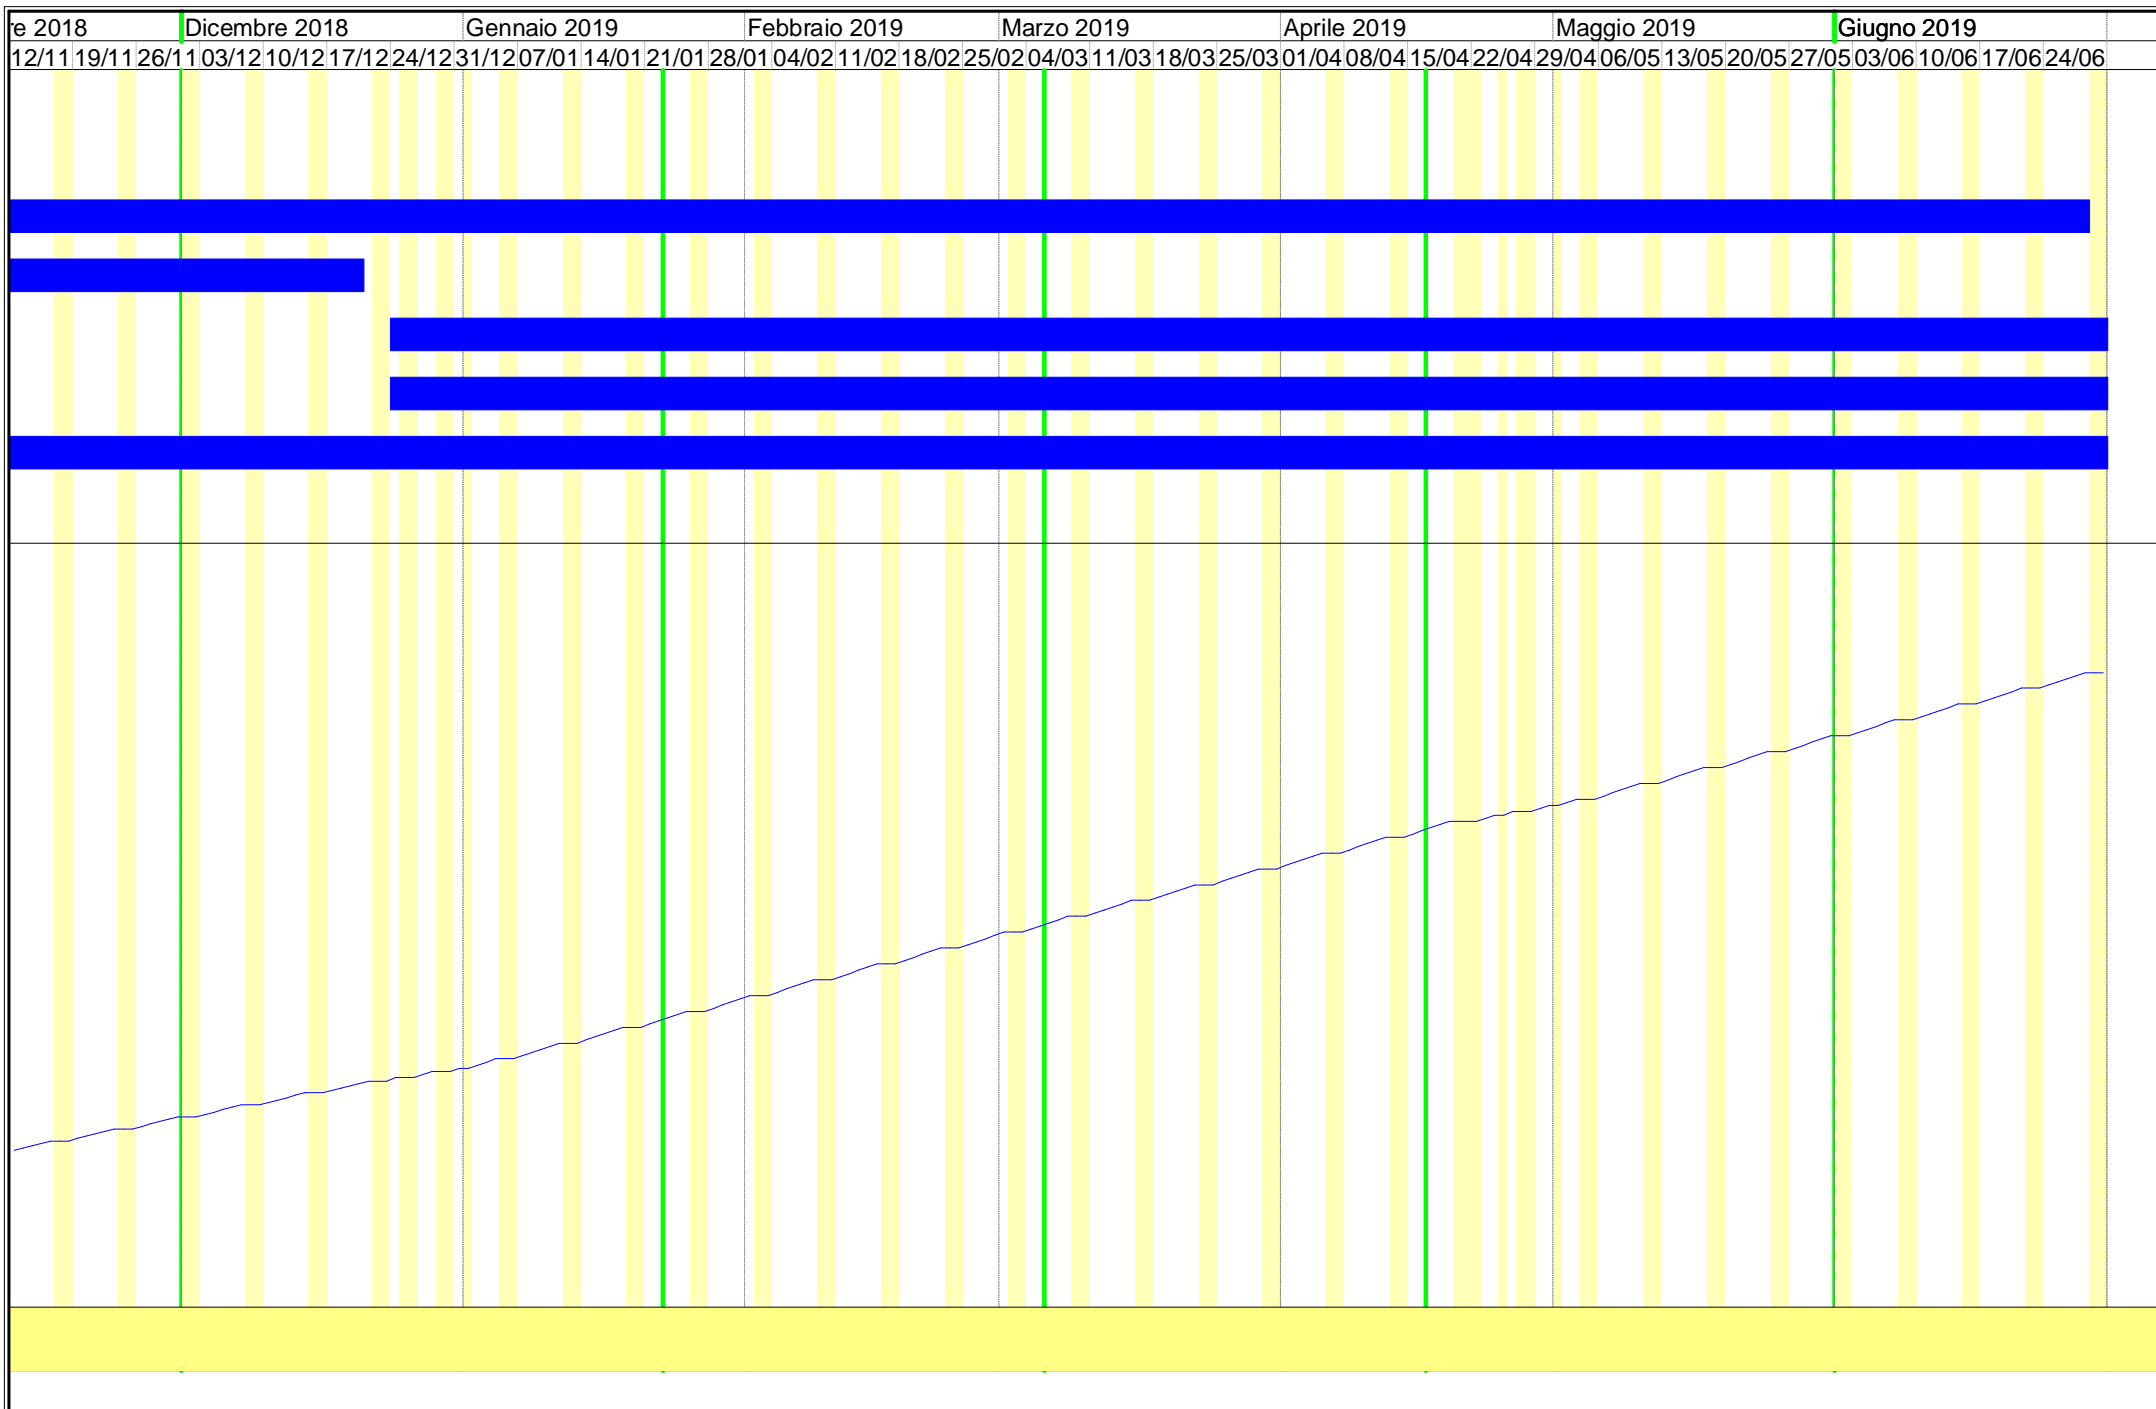

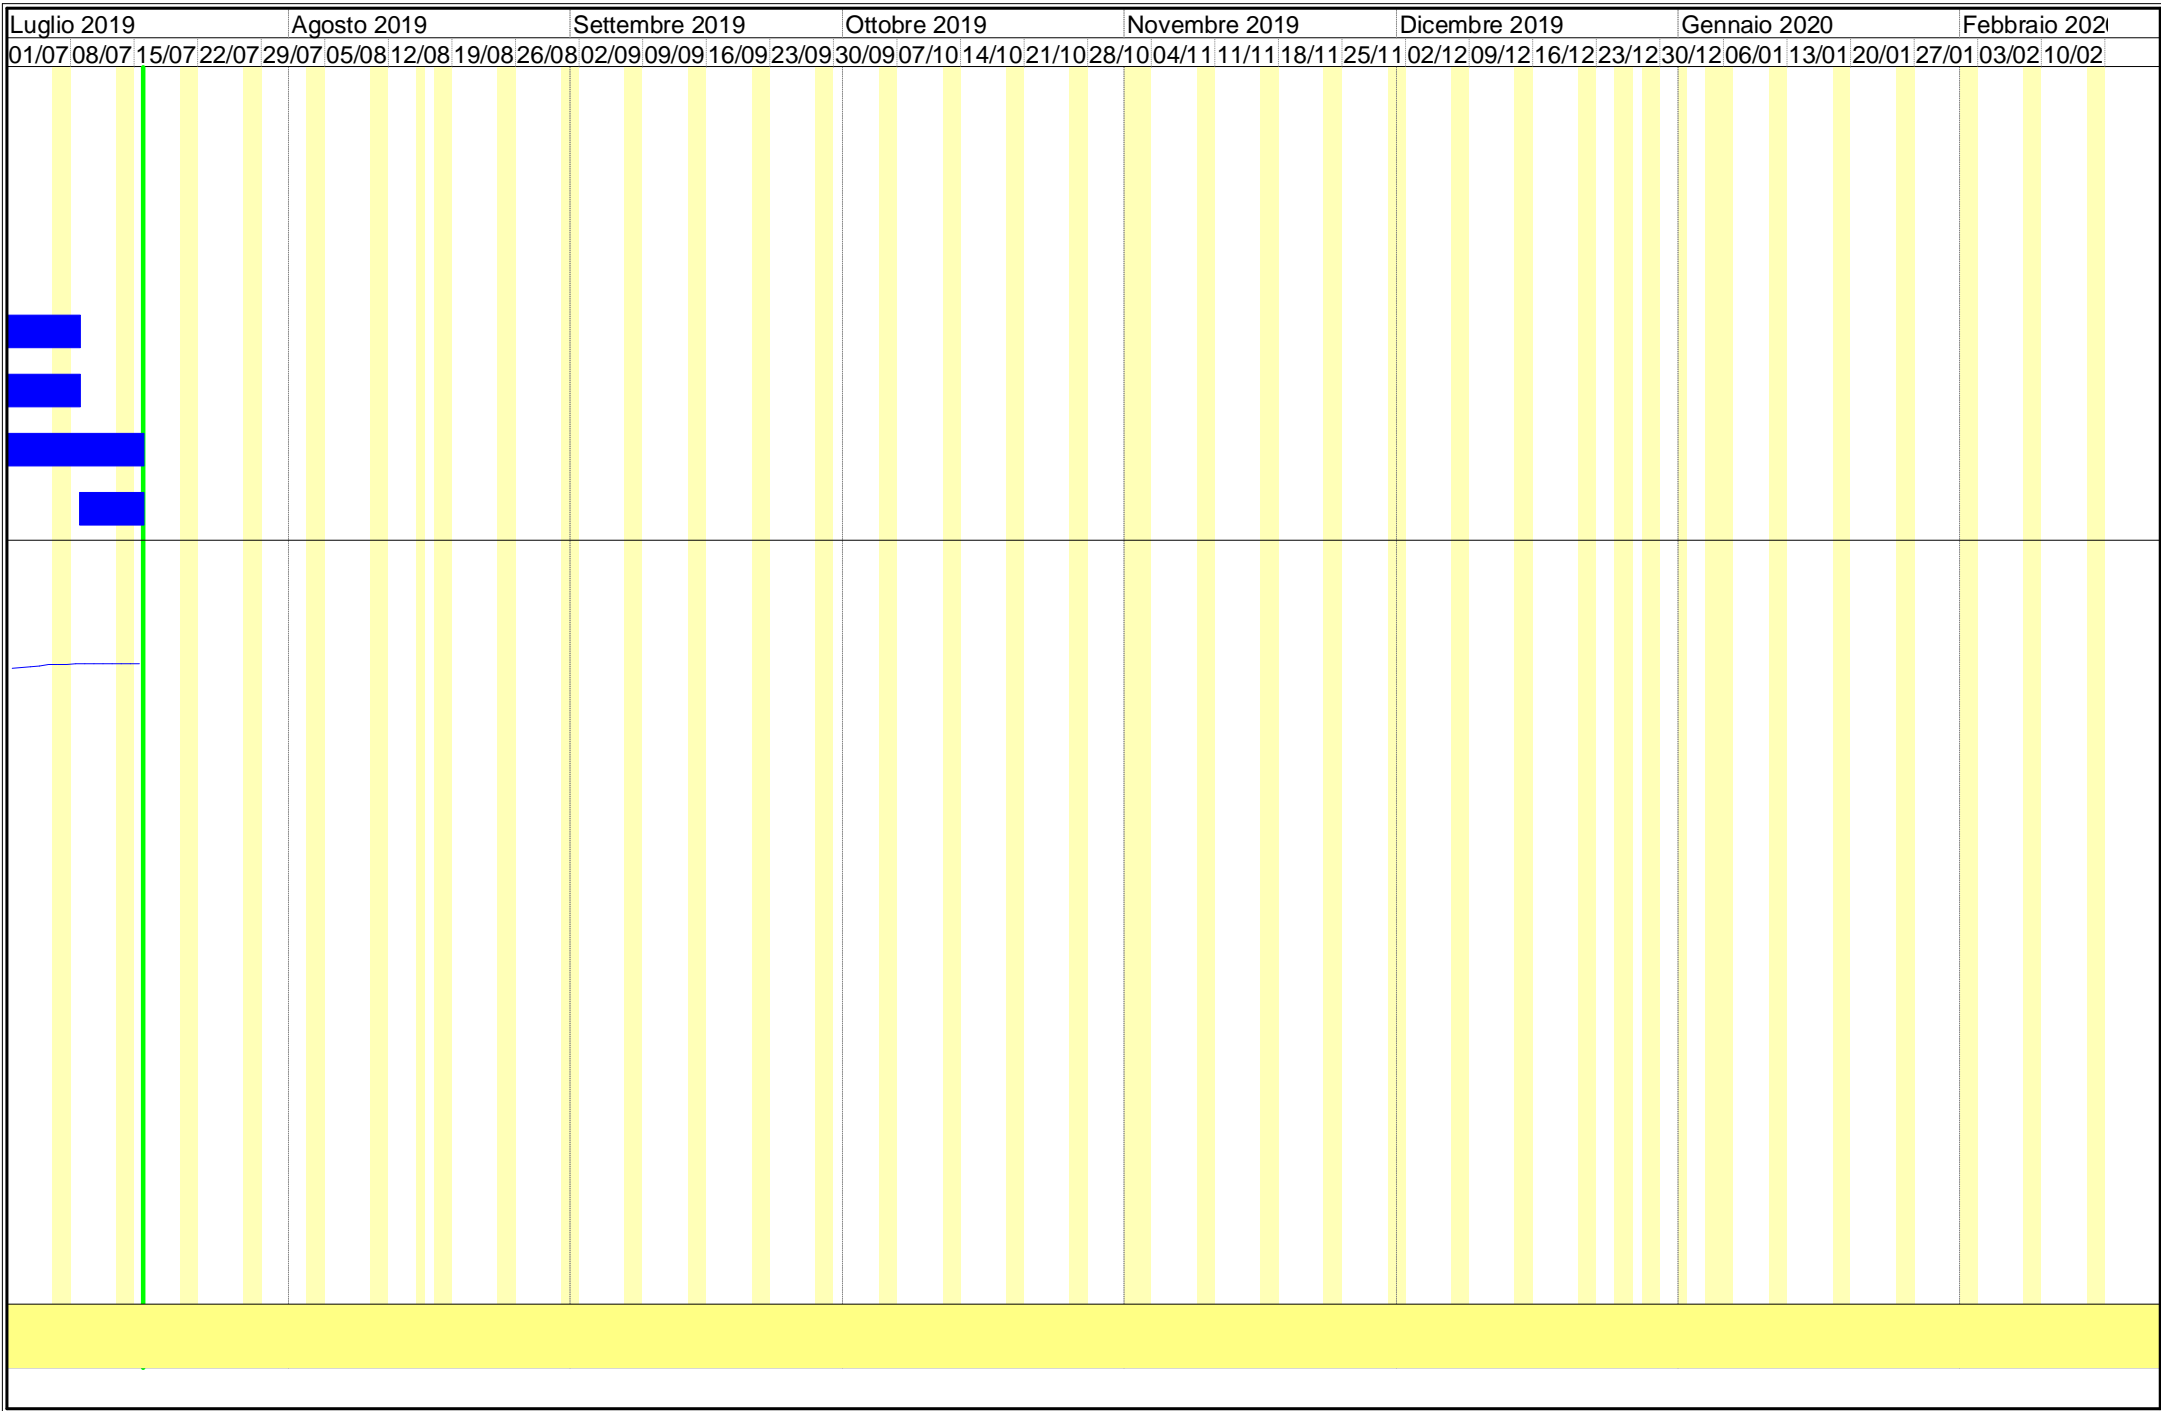



# COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

## PROVINCIA DI SALERNO

### Tabella Attività

**OGGETTO:** LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA CONDOTTA SOTTOMARINA DI SCARICO NEL COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

**COMMITTENTE:** AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAPACCIO PAESTUM

Capaccio Paestum, 01/02/2018



Il Tecnico



AREA IV

Il Responsabile del Servizio 1

Dottore in Ingegneria

Christian FRANCO

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Christian Franco", is written over the printed name.

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
Installazione del cantiere	0,00	0,000	16/07/2018	18/07/2018	3	3
movimento di materia	261'051,14	12,695	20/07/2018	31/10/2018	73	104
tubazioni,pezzi idraulici ecc...	1'343'950,86	65,355	28/09/2018	28/06/2019	189	274
ripristini pavimentazioni stradali	12'771,00	0,621	02/11/2018	20/12/2018	35	49
Calcestruzzo,acciaio,casseforme ecc...	225'600,00	10,971	24/12/2018	08/07/2019	135	197
lavori vari	156'627,00	7,617	24/12/2018	08/07/2019	135	197
Sicurezza	56'392,23	2,742	16/07/2018	15/07/2019	253	365
Smobilizzo cantiere	0,00	0,000	09/07/2019	15/07/2019	5	7
<p>Capaccio Paestum, 01/02/2018</p> <div>  <p><b>Tecnico</b>  <b>AREA IV</b>  <b>Il Responsabile del Servizio 1</b>  <b>Dottore in Ingegneria</b>  <b>Christian FRANCO</b></p>  </div>						

# COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

## PROVINCIA DI SALERNO

### Tabella Date e Importi

**OGGETTO:** LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA CONDOTTA SOTTOMARINA DI SCARICO NEL COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

**COMMITTENTE:** AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAPACCIO PAESTUM

Capaccio Paestum, 01/02/2018



Il Tecnico  
**AREA IV**  
**Il Responsabile del Servizio I**  
Dottore in Ingegneria  
**Christian FRANCO**

A large, stylized handwritten signature in blue ink, appearing to read "Christian Franco", is written over the printed name and extends across the bottom of the page.

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
16/07/2018	222,89	222,89	0,011
17/07/2018	222,89	445,79	0,022
18/07/2018	222,89	668,68	0,033
19/07/2018	222,89	891,58	0,043
20/07/2018	3'798,94	4'690,51	0,228
23/07/2018	3'798,94	8'489,45	0,413
24/07/2018	3'798,94	12'288,39	0,598
25/07/2018	3'798,94	16'087,33	0,782
26/07/2018	3'798,94	19'886,26	0,967
27/07/2018	3'798,94	23'685,20	1,152
30/07/2018	3'798,94	27'484,14	1,337
31/07/2018	3'798,94	31'283,07	1,521
01/08/2018	3'798,94	35'082,01	1,706
02/08/2018	3'798,94	38'880,95	1,891
03/08/2018	3'798,94	42'679,89	2,075
06/08/2018	3'798,94	46'478,82	2,260
07/08/2018	3'798,94	50'277,76	2,445
08/08/2018	3'798,94	54'076,70	2,630
09/08/2018	3'798,94	57'875,63	2,814
10/08/2018	3'798,94	61'674,57	2,999
13/08/2018	3'798,94	65'473,51	3,184
14/08/2018	3'798,94	69'272,45	3,369
16/08/2018	3'798,94	73'071,38	3,553
17/08/2018	3'798,94	76'870,32	3,738
20/08/2018	3'798,94	80'669,26	3,923
21/08/2018	3'798,94	84'468,20	4,108
22/08/2018	3'798,94	88'267,13	4,292
23/08/2018	3'798,94	92'066,07	4,477
24/08/2018	3'798,94	95'865,01	4,662
27/08/2018	3'798,94	99'663,94	4,847
28/08/2018	3'798,94	103'462,88	5,031
29/08/2018	3'798,94	107'261,82	5,216
30/08/2018	3'798,94	111'060,76	5,401
31/08/2018	3'798,94	114'859,69	5,585
03/09/2018	3'798,94	118'658,63	5,770
04/09/2018	3'798,94	122'457,57	5,955
05/09/2018	3'798,94	126'256,50	6,140
06/09/2018	3'798,94	130'055,44	6,324
07/09/2018	3'798,94	133'854,38	6,509
10/09/2018	3'798,94	137'653,32	6,694

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
11/09/2018	3'798,94	141'452,25	6,879
12/09/2018	3'798,94	145'251,19	7,063
13/09/2018	3'798,94	149'050,13	7,248
14/09/2018	3'798,94	152'849,06	7,433
17/09/2018	3'798,94	156'648,00	7,618
18/09/2018	3'798,94	160'446,94	7,802
19/09/2018	3'798,94	164'245,88	7,987
20/09/2018	3'798,94	168'044,81	8,172
21/09/2018	3'798,94	171'843,75	8,357
24/09/2018	3'798,94	175'642,69	8,541
25/09/2018	3'798,94	179'441,63	8,726
26/09/2018	3'798,94	183'240,56	8,911
27/09/2018	3'798,94	187'039,50	9,096
28/09/2018	10'909,79	197'949,29	9,626
01/10/2018	10'909,79	208'859,08	10,157
02/10/2018	10'909,79	219'768,86	10,687
03/10/2018	10'909,79	230'678,65	11,218
04/10/2018	10'909,79	241'588,44	11,748
05/10/2018	10'909,79	252'498,23	12,279
08/10/2018	10'909,79	263'408,02	12,809
09/10/2018	10'909,79	274'317,81	13,340
10/10/2018	10'909,79	285'227,59	13,870
11/10/2018	10'909,79	296'137,38	14,401
12/10/2018	10'909,79	307'047,17	14,931
15/10/2018	10'909,79	317'956,96	15,462
16/10/2018	10'909,79	328'866,75	15,992
17/10/2018	10'909,79	339'776,54	16,523
18/10/2018	10'909,79	350'686,32	17,053
19/10/2018	10'909,79	361'596,11	17,584
22/10/2018	10'909,79	372'505,90	18,115
23/10/2018	10'909,79	383'415,69	18,645
24/10/2018	10'909,79	394'325,48	19,176
25/10/2018	10'909,79	405'235,27	19,706
26/10/2018	10'909,79	416'145,05	20,237
29/10/2018	10'909,79	427'054,84	20,767
30/10/2018	10'909,79	437'964,63	21,298
31/10/2018	10'909,79	448'874,42	21,828
02/11/2018	7'698,63	456'573,05	22,203
05/11/2018	7'698,63	464'271,68	22,577
06/11/2018	7'698,63	471'970,31	22,951



DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
07/11/2018	7'698,63	479'668,94	23,326
08/11/2018	7'698,63	487'367,57	23,700
09/11/2018	7'698,63	495'066,20	24,075
12/11/2018	7'698,63	502'764,83	24,449
13/11/2018	7'698,63	510'463,46	24,823
14/11/2018	7'698,63	518'162,10	25,198
15/11/2018	7'698,63	525'860,73	25,572
16/11/2018	7'698,63	533'559,36	25,946
19/11/2018	7'698,63	541'257,99	26,321
20/11/2018	7'698,63	548'956,62	26,695
21/11/2018	7'698,63	556'655,25	27,070
22/11/2018	7'698,63	564'353,88	27,444
23/11/2018	7'698,63	572'052,51	27,818
26/11/2018	7'698,63	579'751,14	28,193
27/11/2018	7'698,63	587'449,77	28,567
28/11/2018	7'698,63	595'148,41	28,941
29/11/2018	7'698,63	602'847,04	29,316
30/11/2018	7'698,63	610'545,67	29,690
03/12/2018	7'698,63	618'244,30	30,065
04/12/2018	7'698,63	625'942,93	30,439
05/12/2018	7'698,63	633'641,56	30,813
06/12/2018	7'698,63	641'340,19	31,188
07/12/2018	7'698,63	649'038,82	31,562
10/12/2018	7'698,63	656'737,45	31,936
11/12/2018	7'698,63	664'436,08	32,311
12/12/2018	7'698,63	672'134,72	32,685
13/12/2018	7'698,63	679'833,35	33,060
14/12/2018	7'698,63	687'531,98	33,434
17/12/2018	7'698,63	695'230,61	33,808
18/12/2018	7'698,63	702'929,24	34,183
19/12/2018	7'698,63	710'627,87	34,557
20/12/2018	7'698,64	718'326,51	34,931
21/12/2018	7'333,75	725'660,25	35,288
24/12/2018	10'165,06	735'825,31	35,782
27/12/2018	10'165,06	745'990,36	36,277
28/12/2018	10'165,06	756'155,42	36,771
31/12/2018	10'165,06	766'320,48	37,265
02/01/2019	10'165,06	776'485,53	37,760
03/01/2019	10'165,06	786'650,59	38,254
04/01/2019	10'165,06	796'815,65	38,748

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
07/01/2019	10'165,06	806'980,70	39,243
08/01/2019	10'165,06	817'145,76	39,737
09/01/2019	10'165,06	827'310,82	40,231
10/01/2019	10'165,06	837'475,87	40,725
11/01/2019	10'165,06	847'640,93	41,220
14/01/2019	10'165,06	857'805,98	41,714
15/01/2019	10'165,06	867'971,04	42,208
16/01/2019	10'165,06	878'136,10	42,703
17/01/2019	10'165,06	888'301,15	43,197
18/01/2019	10'165,06	898'466,21	43,691
21/01/2019	10'165,06	908'631,27	44,186
22/01/2019	10'165,06	918'796,32	44,680
23/01/2019	10'165,06	928'961,38	45,174
24/01/2019	10'165,06	939'126,44	45,669
25/01/2019	10'165,06	949'291,49	46,163
28/01/2019	10'165,06	959'456,55	46,657
29/01/2019	10'165,06	969'621,61	47,152
30/01/2019	10'165,06	979'786,66	47,646
31/01/2019	10'165,06	989'951,72	48,140
01/02/2019	10'165,06	1'000'116,77	48,635
04/02/2019	10'165,06	1'010'281,83	49,129
05/02/2019	10'165,06	1'020'446,89	49,623
06/02/2019	10'165,06	1'030'611,94	50,117
07/02/2019	10'165,06	1'040'777,00	50,612
08/02/2019	10'165,06	1'050'942,06	51,106
11/02/2019	10'165,06	1'061'107,11	51,600
12/02/2019	10'165,06	1'071'272,17	52,095
13/02/2019	10'165,06	1'081'437,23	52,589
14/02/2019	10'165,06	1'091'602,28	53,083
15/02/2019	10'165,06	1'101'767,34	53,578
18/02/2019	10'165,06	1'111'932,40	54,072
19/02/2019	10'165,06	1'122'097,45	54,566
20/02/2019	10'165,06	1'132'262,51	55,061
21/02/2019	10'165,06	1'142'427,56	55,555
22/02/2019	10'165,06	1'152'592,62	56,049
25/02/2019	10'165,06	1'162'757,68	56,544
26/02/2019	10'165,06	1'172'922,73	57,038
27/02/2019	10'165,06	1'183'087,79	57,532
28/02/2019	10'165,06	1'193'252,85	58,027
01/03/2019	10'165,06	1'203'417,90	58,521

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
04/03/2019	10'165,06	1'213'582,96	59,015
05/03/2019	10'165,06	1'223'748,02	59,509
06/03/2019	10'165,06	1'233'913,07	60,004
07/03/2019	10'165,06	1'244'078,13	60,498
08/03/2019	10'165,06	1'254'243,18	60,992
11/03/2019	10'165,06	1'264'408,24	61,487
12/03/2019	10'165,06	1'274'573,30	61,981
13/03/2019	10'165,06	1'284'738,35	62,475
14/03/2019	10'165,06	1'294'903,41	62,970
15/03/2019	10'165,06	1'305'068,47	63,464
18/03/2019	10'165,06	1'315'233,52	63,958
19/03/2019	10'165,06	1'325'398,58	64,453
20/03/2019	10'165,06	1'335'563,64	64,947
21/03/2019	10'165,06	1'345'728,69	65,441
22/03/2019	10'165,06	1'355'893,75	65,936
25/03/2019	10'165,06	1'366'058,81	66,430
26/03/2019	10'165,06	1'376'223,86	66,924
27/03/2019	10'165,06	1'386'388,92	67,419
28/03/2019	10'165,06	1'396'553,97	67,913
29/03/2019	10'165,06	1'406'719,03	68,407
01/04/2019	10'165,06	1'416'884,09	68,901
02/04/2019	10'165,06	1'427'049,14	69,396
03/04/2019	10'165,06	1'437'214,20	69,890
04/04/2019	10'165,06	1'447'379,26	70,384
05/04/2019	10'165,06	1'457'544,31	70,879
08/04/2019	10'165,06	1'467'709,37	71,373
09/04/2019	10'165,06	1'477'874,43	71,867
10/04/2019	10'165,06	1'488'039,48	72,362
11/04/2019	10'165,06	1'498'204,54	72,856
12/04/2019	10'165,06	1'508'369,60	73,350
15/04/2019	10'165,06	1'518'534,65	73,845
16/04/2019	10'165,06	1'528'699,71	74,339
17/04/2019	10'165,06	1'538'864,76	74,833
18/04/2019	10'165,06	1'549'029,82	75,328
19/04/2019	10'165,06	1'559'194,88	75,822
23/04/2019	10'165,06	1'569'359,93	76,316
24/04/2019	10'165,06	1'579'524,99	76,810
26/04/2019	10'165,06	1'589'690,05	77,305
29/04/2019	10'165,06	1'599'855,10	77,799
30/04/2019	10'165,06	1'610'020,16	78,293



DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
02/05/2019	10'165,06	1'620'185,22	78,788
03/05/2019	10'165,06	1'630'350,27	79,282
06/05/2019	10'165,06	1'640'515,33	79,776
07/05/2019	10'165,06	1'650'680,38	80,271
08/05/2019	10'165,06	1'660'845,44	80,765
09/05/2019	10'165,06	1'671'010,50	81,259
10/05/2019	10'165,06	1'681'175,55	81,754
13/05/2019	10'165,06	1'691'340,61	82,248
14/05/2019	10'165,06	1'701'505,67	82,742
15/05/2019	10'165,06	1'711'670,72	83,237
16/05/2019	10'165,06	1'721'835,78	83,731
17/05/2019	10'165,06	1'732'000,84	84,225
20/05/2019	10'165,06	1'742'165,89	84,720
21/05/2019	10'165,06	1'752'330,95	85,214
22/05/2019	10'165,06	1'762'496,01	85,708
23/05/2019	10'165,06	1'772'661,06	86,202
24/05/2019	10'165,06	1'782'826,12	86,697
27/05/2019	10'165,06	1'792'991,17	87,191
28/05/2019	10'165,06	1'803'156,23	87,685
29/05/2019	10'165,06	1'813'321,29	88,180
30/05/2019	10'165,06	1'823'486,34	88,674
31/05/2019	10'165,06	1'833'651,40	89,168
03/06/2019	10'165,06	1'843'816,46	89,663
04/06/2019	10'165,06	1'853'981,51	90,157
05/06/2019	10'165,06	1'864'146,57	90,651
06/06/2019	10'165,06	1'874'311,63	91,146
07/06/2019	10'165,06	1'884'476,68	91,640
10/06/2019	10'165,06	1'894'641,74	92,134
11/06/2019	10'165,06	1'904'806,80	92,629
12/06/2019	10'165,06	1'914'971,85	93,123
13/06/2019	10'165,06	1'925'136,91	93,617
14/06/2019	10'165,06	1'935'301,96	94,112
17/06/2019	10'165,06	1'945'467,02	94,606
18/06/2019	10'165,06	1'955'632,08	95,100
19/06/2019	10'165,06	1'965'797,13	95,594
20/06/2019	10'165,06	1'975'962,19	96,089
21/06/2019	10'165,06	1'986'127,25	96,583
24/06/2019	10'165,06	1'996'292,30	97,077
25/06/2019	10'165,06	2'006'457,36	97,572
26/06/2019	10'165,06	2'016'622,42	98,066

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
27/06/2019	10'165,06	2'026'787,47	98,560
28/06/2019	10'165,06	2'036'952,53	99,055
01/07/2019	3'054,21	2'040'006,73	99,203
02/07/2019	3'054,21	2'043'060,94	99,352
03/07/2019	3'054,21	2'046'115,14	99,500
04/07/2019	3'054,21	2'049'169,35	99,649
05/07/2019	3'054,21	2'052'223,55	99,797
08/07/2019	3'054,20	2'055'277,76	99,946
09/07/2019	222,89	2'055'500,65	99,957
10/07/2019	222,89	2'055'723,55	99,967
11/07/2019	222,89	2'055'946,44	99,978
12/07/2019	222,89	2'056'169,33	99,989
15/07/2019	222,89	2'056'392,22	100,000
<p>Capaccio Paestum, 01/02/2018</p> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;">  <div style="margin-left: 20px;"> <p><b>Tecnico</b></p> <p><b>AREA IV</b></p> <p><b>Il Responsabile del Servizio I</b></p> <p><b>Dottore in Ingegneria</b></p> <p><b>Christian FRANCO</b></p>  </div> </div>			

DESCRIZIONE	VALORE
<b>Tipologia Documento</b> <b>Comune</b> <b>Provincia</b> <b>Oggetto</b> <b>Committente</b> <b>Tecnico</b> <b>Impresa</b> <b>Luogo</b> <b>Data</b> <b>Importo per l'emissione dei SAL</b>	Cronoprogramma di progettazione COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM PROVINCIA DI SALERNO LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA CONDOTTA SOTTOMARINA DI SCARICO NEL COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAPACCIO PAESTUM  Capaccio Paestum 01/02/2018 300'000,00

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAPACCIO PAESTUM

DESCRIZIONE	Mesi												Media
	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
Favorevole	90	90	90	90	90	90	90	45	90	90	90	45	82,50
<div> <div>GRAFICO</div> <div> <div>Favorevole</div> </div> </div>													
Normale	15	15	75	90	90	90	90	45	90	90	75	15	65,00
<div> <div>Normale</div> </div>													
Sfavorevole	15	15	45	90	90	90	90	45	90	75	45	15	58,75
<div> <div>Sfavorevole</div> </div>													

DESCRIZIONE	Mesi												Media																																																			
	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic																																																				
<div><div>Favorevole - Normale - Sfavorevole</div><table><caption>Data for Favorevole - Normale - Sfavorevole chart</caption><thead><tr><th>Mese</th><th>Favorevole (%)</th><th>Normale (%)</th><th>Sfavorevole (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Gen</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td></tr><tr><td>Feb</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td></tr><tr><td>Mar</td><td>100</td><td>80</td><td>50</td></tr><tr><td>Apr</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td></tr><tr><td>Mag</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td></tr><tr><td>Giu</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td></tr><tr><td>Lug</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td></tr><tr><td>Ago</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td></tr><tr><td>Set</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td></tr><tr><td>Ott</td><td>100</td><td>100</td><td>80</td></tr><tr><td>Nov</td><td>100</td><td>80</td><td>50</td></tr><tr><td>Dic</td><td>50</td><td>20</td><td>20</td></tr></tbody></table></div>	Mese	Favorevole (%)	Normale (%)	Sfavorevole (%)	Gen	100	20	20	Feb	100	20	20	Mar	100	80	50	Apr	100	100	100	Mag	100	100	100	Giu	100	100	100	Lug	100	100	100	Ago	50	50	50	Set	100	100	100	Ott	100	100	80	Nov	100	80	50	Dic	50	20	20												
	Mese	Favorevole (%)	Normale (%)	Sfavorevole (%)																																																												
	Gen	100	20	20																																																												
	Feb	100	20	20																																																												
	Mar	100	80	50																																																												
	Apr	100	100	100																																																												
	Mag	100	100	100																																																												
	Giu	100	100	100																																																												
	Lug	100	100	100																																																												
	Ago	50	50	50																																																												
	Set	100	100	100																																																												
	Ott	100	100	80																																																												
Nov	100	80	50																																																													
Dic	50	20	20																																																													
